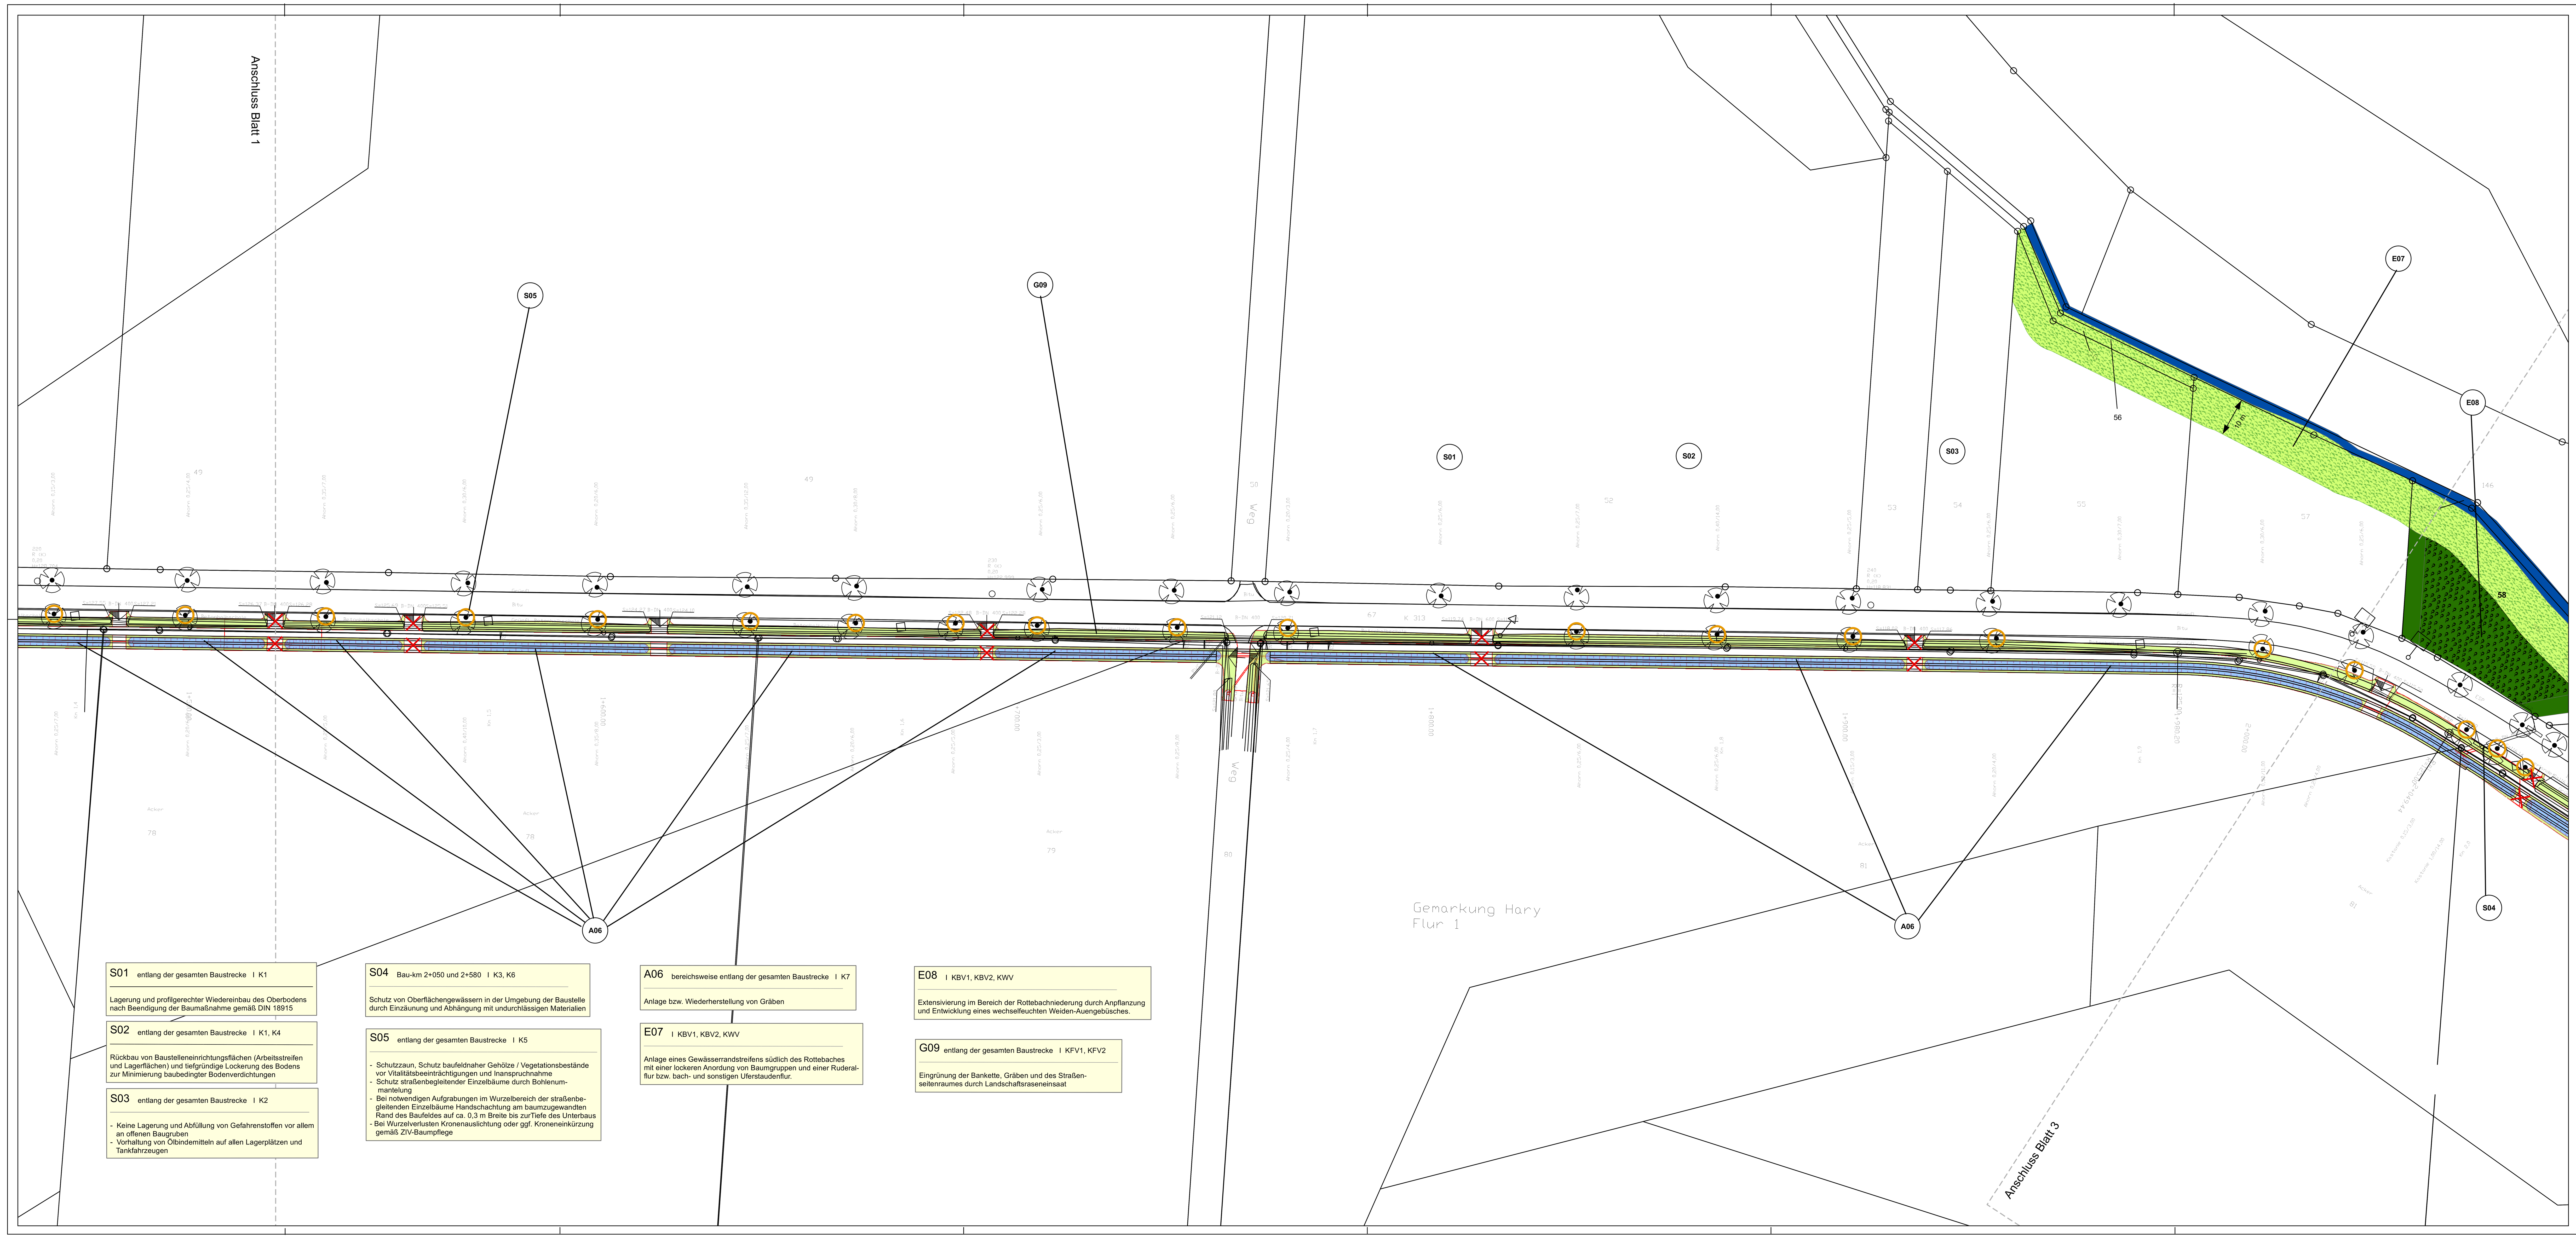

Maßnahmen

Schutzmaßnahmen

- S01 – Lagerung und profilgerechter Wiederaufbau des Oberbodens nach Beendigung der Baumaßnahme gemäß DIN 18 915
- S02 – Rückbau von Baustelleneinrichtungsflächen (Arbeitsstreifen und Lagerflächen) und tiefgründige Lockerung des Bodens zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen
- S03 – Keine Lagerung und Abfüllung von Gefahrenstoffen vor allem an offenen Baugruben sowie Vorhaltung von Ölbindemitteln auf allen Lagerplätzen und Tankfahrzeugen
- S04 – Schutz von Oberflächengewässer in der Umgebung der Baustelle durch Einzäunung und Abhängung mit undurchlässigen Materialien
- S05 – Schutzzäune im Wurzelbereich /Kronentraufe zzgl. 1,50 m bzw. am Rand des Baufeldes zum Schutz angrenzender Gehölz- und Vegetationsbestände während der Bauphase
  Bei geringem Platzangebot Stammschutz durch Bohlenummantelung vor allem bei straßenbegleitenden Bäumen
  Bei notwendigen Aufgrabungen im Wurzelbereich Handschachtung am baumzugewandten Rand des Baufeldes auf ca. 0,3 m Breite bis zurTiefe des Unterbaus
  Bei Wurzelverlusten ist eine Kronenauslichtung oder ggf. eine Kroneneinkürzung gemäß ZTV-Baumpflege erforderlich

Einzelbaumschutz — Schutzzaun

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A und E)

- Anlage bzw. Wiederherstellung von Gräben (A06)
- Anlage eines Gewässerrandstreifen südlich entlang des Rottebaches mit Ruderalflur bzw. bach- und sonstiger Uferstaudenflur (E07)
- Anlage eines wechselfeuchten Weiden-Auengebüsches (E08)

Gestaltungsmaßnahmen (G)

- Eingrünung der Bankette, Gräben und des Straßenseitenraumes (G09)

Sonstiges

- entfallende Zufahrten

Neubau eines Radweges an der K 313 von OD Hary bis B 243
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Maßnahmenplan

Maßnahmenerläuterung

Maßnahmen Nr. — Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer bzw. Angabe zur Lage der Maßnahme (Bau-km)

S02 entlang der gesamten Baustrecke I K5

Rückbau von Baustelleneinrichtungsflächen (Arbeitsstreifen und Lagerflächen) und tiefgründige Lockerung des Bodens zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen ← Erläuterung der Maßnahme

A: Ausgleichsmaßnahme
E: Ersatzmaßnahme
S: Schutzmaßnahme
G: Gestaltungssmaßnahme

0 10 20 30 40 50 Meter

N

Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			

BÜRO DRECKER
Bottrop · Halle/S. · Hannover · Potsdam
Eichstraße 57a
30161 Hannover
hannover@drecker.de
T +49 (0)511 8664958- 0
F +49 (0)511 8664958-10
www.drecker.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	Juli 2012	Mo/No
gezeichnet	Juli 2012	Mo/Kra
geprüft	02.07.2012 E. Nowak	

Blatt 1 2 3 4

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: K 313 von km: 0,926 bis km 2,517

(Nächster Ort): Hary

Unterlage 9.2

Blatt Nr. 2

Reg. Nr.

	Datum	Zeichen
nachgeprüft	25.07.2012	Böll

Neubau des Radweges an der K 313 zwischen der OD Hary und der B 243

Bau-km 2+363 bis Bau-km 2+583,77

PLANFESTSTELLUNG

Maßnahmenplan

Maßstab 1: 500

Aufgestellt:

Hannover, den 07.08.2012
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Hannover

im Auftrage: gez. Spring

Grundplan Grundriß	Grundplan Kataster	hergestellt:
terrestr./ photogr. Aufnahme von November 2011 verm.-techn. / bautechn. Feldvergleich vom 21.11.11	Maßnahme: K 313 Maßstab EDBS-Datensatz Stand: 2011	Nov. 2011 Ingenieurbüro Keuntje GmbH
